

FINIQUITO DE OBRA

No. DE CONTRATO: SOP-MTY-FAISMUN-04/25-IR
DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN CALLE CESAR LAZO ENTRE LAS CALLES ARTURO B. DE LA GARZA Y SOLIDARIDAD DE LA COLONIA CERRO DE LA CAMPANA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.
CONTRATISTA: CONSTRUCCION INDUSTRIAL Y PROVEEDORES BELES, S.A. DE C.V.

No.		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	EST. No. 1 NORMAL		EST. No. 2 NORMAL		EST. No. 3 NORMAL		EST. No. 4 NORMAL		EST. No. 5 NORMAL		DEDUCTIVAS		EST. No. 1 ADITIVA		EST. No.
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	
	PRELIMINARES																			
1	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN, ESTABLECIENDO REFERENCIAS, UBICACIÓN DE PUNTOS REFERENTES, BANCOS DE NIVEL, ETC., INCLUYE: BRIGADA TOPOGRAFICA A DISPOSICION DE LA SUPERVISION DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA EJECUCION DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA.Y EN SI TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	230.00	\$97.47	22,418.10	34.07	3,320.80	62.34	6,076.28	40.90	3,986.52	92.69	9,034.49			0.00	0.00	0.81	78.95	79.24
2	RETIRO DE TUBERÍA DE 3" Ø GALVANIZADO EXISTENTE SIN RECUPERACIÓN; INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	179.40	\$271.25	48,662.25											179.40	48,662.25			
3	CARGA, ACARREO Y DESCARGA DEL MATERIAL DE BASURA, ESCOMBRO, CORTES, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y/O PRODUCTO DE LA LIMPIEZA EXISTENTE EN EL AREA A TIRO LIBRE EN CAMIÓN DE VOLTEO, Y DESCARGA A TIRADEROS AUTORIZADOS POR MUNICIPIO, VOLUMEN MEDIDO EN CAJA, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y EN SI TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	69.00	\$779.16	53,762.04	9.88	7,698.10	18.70	14,570.29	15.60	12,154.90	24.82	19,338.75			0.00	0.00	20.74	16,159.78	15.85
	ESCALINATA																			
4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE HERBICIDA SOBRE EL MATERIAL DE BASE PARA INHIBIR EL CRECIMIENTO DE HIERBA, EN RENDIMIENTO DE ACUERDO AL PROVEEDOR, INCLUYE: HERRAMIENTAS, EQUIPOS DE ASPERSION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	230.00	\$320.56	73,728.80	34.07	10,921.48	62.34	19,983.71	40.90	13,110.90			79.24	25,401.17	13.45	4,311.53			
5	CORTE EN MATERIAL TIPO I Y II POR MEDIOS MANUALES DE ACUERDO A NIVELES DEL PROYECTO HASTA NIVEL DE SUBRASANTE VOLUMEN MEDIDO EN CAJA; INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	20.70	\$1,360.74	28,167.32					7.36	10,015.05	13.34	18,152.27			0.00	0.00	11.97	16,288.06	15.85
6	CORTE EN MATERIAL TIPO III POR MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES DE ACUERDO A NIVELES DEL PROYECTO HASTA NIVEL DE SUBRASANTE VOLUMEN MEDIDO EN CAJA; INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	48.30	\$1,670.64	80,691.91	9.88	16,505.92	18.70	31,240.97	8.24	13,766.07	2.71	4,527.43			8.77	14,651.51			
7	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE BANQUETA Y/O FIRME DE CONCRETO F'C=150 KGS/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 / 10-10 SEGUN PROYECTO, ACABADO ESTRIADO CON CEMENTO GRIS, INCLUYE JUNTAS DE CONTRACCIÓN, EXPANSION Y CONSTRUCCIÓN, PERFILADOS, SELLADO DE JUNTAS, CIMBRADO, COLADO, CURADO, ACARREOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	25.30	\$1,675.02	42,378.01											25.30	42,378.01			
8	TERRAPLEN CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 m. DE ESP. HOMOGENIZADO Y COMPACTADO AL 95% DE SU PYSM VOLUMEN MEDIDO EN CAJA INCLUYE: AGUA PARA DAR HUMEDAD OPTIMA, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M3	50.60	\$3,783.70	191,455.22	6.81	25,767.00	12.47	47,182.74	8.18	30,950.67					23.14	87,554.82			
9	ESCARIFICACION, CONFORMACION Y COMPACTACION DE TERRACERIAS DE 20 CM Y MEJORADAS CON TEPETATE Y CAL AL 5% EN VOLUMEN AGREGANDO EL AGUA NECESARIA, COMPACTADA AL 95% SEGÚN PRUEBA DE LABORATORIO PROCTOR, INCLUYE: HERRAMIENTA, MAQUINARIA, MATERIALES, EQUIPO, AGUA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	230.00	\$1,474.14	339,052.20											230.00	339,052.20			
10	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS DE CONCRETO HIDRAULICO F'C = 150 KG/CM2, CON ESCALONES DE 0.17 M. DE PERALTE Y 0.30 M. DE HUELLA, PLANTILLA DE 8 CMS. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 Y ACABADO FLOTEADO CON LLANA DE MADERA; INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	204.70	\$2,037.28	417,031.22	34.07	69,410.13	62.34	127,004.04	40.90	83,324.75	1.93	3,931.95	65.46	133,360.35	0.00	0.00			13.78
11	FABRICACIÓN DE BARANDAL METÁLICO EN DIÁMETROS DE 2 1/2", 2" Y 1 1/2" CED 30 INCLUYE DOS ÁNGULOS Y DOS TAQUETES EXPANSORES POR APOYO. SOLDADO, PULIDO, RELLENO, FIJADO Y CIMENTADO EN MATERIAL TIPO III MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS, FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA VERDE INSTITUCIONAL EN TODA LA SECCIÓN. APOYOS @ 2.50 MT. MAXIMO.	M.L.	209.30	\$3,009.40	629,867.42					109.58	329,770.05	26.52	79,809.29	50.00	150,470.00	23.20	69,818.08			
12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE 3" Ø GALVANIZADA OCULTA; INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M.L.	115.00	\$864.92	99,465.80											115.00	99,465.80			
	INSTALACION ELECTRICA																			
13	SUMINISTRO Y TENDIDO EN ZANJA DE POLIDUCTO NARANJA 2" DE DIAMETRO SIN CABLEADO. INCLUYE: EMPATES, EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL TIPO I Y II, MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS, RELLENOS, ENCOFRADOS CON CONCRETO POBRE, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	115.00	\$905.16	104,093.40											115.00	104,093.40			
14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE CAL. 10 AWG TIPO THW-LS 90° 600 V, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, O SIMILAR. INCLUYE: EMPATES, AMARRES, CINTA DE AISLAR, DESPERDICIOS, TRASLAPES, PUNTAS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	126.50	\$62.04	7,848.06											126.50	7,848.06			
15	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO PSD, CAL 4, 600V 2+1 VIAKON O SIMILAR. INCLUYE: EMPATES, AMARRES, CINTA DE AISLAR, DESPERDICIOS, TRASLAPES, PUNTAS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	126.50	\$130.52	16,510.78											126.50	16,510.78			
16	SUM. Y COLOCACIÓN DE REGISTRO ELECTRICO CIRCULAR CON TAPA PARA ALUMBRADO PÚBLICO, FIBRA DE VIDRIO Y CONCRETO POLIMERICO, MARCA ANTARES O SIMILAR, DE 10" DE DIAMETRO Y 40 CM. DE PRFOUNDIDAD. INCLUYE: EXCAVACIONES, FIJACION O ENCOFRADO CON CONCRETO POBRE, CONEXION AL MURETE Y A LA BASE DEL MEDIDOR MEDIANTE TENDIDO EN ZANJA DE POLIDUCTO NARANJA 2" DE DIAMETRO CON CABLEADO A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 3 A 4 MTS , INCLUYE: MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PZA	7.00	\$4,118.88	28,832.16											7.00	28,832.16			
17	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA QO-12 MARCA SQUARE-D O EQUIVALENTE, INCLUYE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 1x 20 AMPS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA INC	PZA	1.00	\$8,771.25	8,771.25											1.00	8,771.25			
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE CONTROL PARA OPERACIÓN AUTOMÁTICA DE ALUMBRADO PÚBLICO. INCLUYE: TRANSICIÓN SUBTERRÁNEA DE CIRCUITOS, COLOCACIÓN, TUBERÍA Y CONEXIONES DE CONDUIT FLEXIBLE DE 1 1/4" DE DIÁMETRO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	\$6,225.71	6,225.71											1.00	6,225.71			
19	TRAMITE PARA LA GESTIÓN DE CONTRATO DE SERVICIO ELECTRICO ANTE CFE A NOMBRE DE MUNICIPIO DE MONTERREY.	PZA	1.00	\$32,078.34	32,078.34											1.00	32,078.34			
20	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE ENCENDIDO COMPLETA EN GABINETE METALICO, INCLUYE: MATERIALES ELECTRICOS COMO (INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS, CONTACTORES, FOTOCELDA, ETC.), PRUEBAS, CONEXIONES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, TUBERIA CONDUIT, MUFA, TIERRA FISICA, Y EN SI TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	\$16,392.26	16,392.26											1.00	16,392.26			

OPERADO
2025 -
FAISMUN / RAMO 33

19/25

FINIQUITO DE OBRA

No. DE CONTRATO: SOP-MTY-FAISMUN-04/25-IR
DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN CALLE CESAR LAZO ENTRE LAS CALLES ARTURO B. DE LA GARZA Y SOLIDARIDAD DE LA COLONIA CERRO DE LA CAMPANA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.
CONTRATISTA: CONSTRUCCION INDUSTRIAL Y PROVEEDORES BELES, S.A. DE C.V.

No.		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	EST. No. 1 NORMAL		EST. No. 2 NORMAL		EST. No. 3 NORMAL		EST. No. 4 NORMAL		EST. No. 5 NORMAL		DEDUCTIVAS		EST. No. 1 ADITIVA		EST. No.
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD
21	CONSTRUCCIÓN DE MURETE PARA COLOCAR MEDIDOR DE CFE A BASE DE BLOCK No. 6 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:4, HASTA 2.0 MTS DE ALTURA X 1.00 m. DE ANCHO, A MEZCLA CORTADA, AMBAS CARAS, INCLUYE: CIMENTACION DE CONCRETO CICLOPEO, VIGA DE CIMENTACION, CASTILLOS LATERALES, CERRAMIENTO EN LA PARTE SUPERIOR, MATERIALES, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$16,893.76	16,893.76											1.00	16,893.76			
22	SUM. Y COLOCACIÓN DE REGISTRO ELECTRICO CIRCULAR CON TAPA PARA ALUMBRADO PUBLICO, FIBRA DE VIDRIO Y CONCRETO POLIMERICO, MARCA ANTARES O SIMILAR, DE 10" DE DIAMETRO Y 40 CM. DE PRFOUNDIDAD. INCLUYE: EXCAVACIONES, FIACION O ENCOFRADO CON CONCRETO POBRE, CONEXION AL MURETE Y A LA BASE DEL MEDIDOR MEDIANTE TENDIDO EN ZANJA DE POLIDUCTO NARANJA 2" DE DIAMETRO CON CABLEADO A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 3 A 4 MTS , INCLUYE: MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$4,118.88	4,118.88											1.00	4,118.88			
23	ILUMINACION CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO DE 30 X 30 X 90 CMS, DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, RELLENO, MADERA PARA CIMBRA, 4 ANCLAS DE 19 MM DE DIAMETRO Y 0.60 MTS DE LONGITUD, CON ROSCA, ARANDELA Y TUERCA, SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, RETIRO DE MATERIAL, LIMPIEZA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	7.00	\$5,359.56	37,516.92							7.00	37,516.92			0.00	0.00			
24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE RECTO CIRCULAR DE 3 MTS DE ALTURA DE 3" DE DIAMETRO, CONSTRUIDO EN LAMINA DE ACERO, ACABADO EN PINTURA COLOR CRIS, CAT. OHILP300/GR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA	PZA	7.00	\$8,747.25	61,230.75							7.00	61,230.75			0.00	0.00			
25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PUNTA DE POSTE MODELO GARDEN DE 3 BRAZOS MCA, INTELLILEDS, CUERPO FABRICADO EN FUNDACIÓN DE ALUMINIO INYECTADO, ACABADO COLOR CAFE, CON PARTE SUPERIOR CONVEXO PARA ELIMINAR ACUMULACIÓN DE LLUVIA Y POLVO, CONJUNTO OPTICO CERRADO Y SELLADO, DE 120 LMW, 5000K GRADOS KELVIN, DISTRIBUCIÓN SIMETRICA, EN DIFUSOR DE POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO, EN PROTECCIÓN IP65, CON FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA, INCLUYE DRIVE ELECTRONICO MULTIVOLTAGE 100-277 VOLTS 60HZ, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS, MATERIALES, CABLEADOS, CONEXIONES, ELEVACIONES, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO, PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	PZA	7.00	\$23,662.93	165,640.51											7.00	165,640.51			
E-1	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO CON CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE RESISTENCIA DE F'C = 250 KG/CM2 DE ESPESOR DE 0.12 M. CON CORTE CON DISCO PARA LAS JUNTAS TRANSVERSALES A CADA 3.00 M. Y ACABADO ESTRIADO FINO CON EL AVION; INCLUYE: MALLA ELECTROSOLDADA DE 6-6/10-10, CIMBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	0.00	\$1,046.69	0.00															
E-2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA SOLAR MARCA INTELLI LEDS MODELO LUKE HLS26W, 26 WATTS, 3380 LM, L860 X A350 X H130MM, CON SENSOR DE MOVIMIENTO Y BATERIA DE LITIO-FERROFOSFATO, PANEL SOLAR Y CARGADOR INTEGRADOS; INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS, MATERIALES, CABLEADOS, CONEXIONES, ELEVACIONES, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	PZA	0.00	\$8,470.53	0.00															

SUBTOTAL	2,532,833.07	SUB-TOTAL 1	133,623.43	SUB-TOTAL 1	246,058.03	SUB-TOTAL 1	497,078.91	SUB-TOTAL 1	233,541.85	SUB-TOTAL 1	309,231.52	SUB-TOTAL 1	1,113,299.33	SUB-TOTAL 1	32,526.79	SUB-TOTAL 1	
I.V.A.	405,253.29	AMORTIZ.	40,087.03	AMORTIZ.	73,817.41	AMORTIZ.	149,123.67	AMORTIZ.	70,062.56	AMORTIZ.	303,000.00	AMORTIZ.	0.00	AMORTIZ.	9,758.04	AMORTIZ.	
TOTAL	2,938,086.36	SUB-TOTAL 1	93,536.40	SUB-TOTAL 1	172,240.62	SUB-TOTAL 1	347,955.24	SUB-TOTAL 1	163,479.29	SUB-TOTAL 1	6,231.52	SUB-TOTAL 1	1,113,299.33	SUB-TOTAL 1	22,768.75	SUB-TOTAL 1	
		I.V.A.	14,965.82	I.V.A.	27,558.50	I.V.A.	55,672.84	I.V.A.	26,156.69	I.V.A.	997.04	I.V.A.	178,127.89	I.V.A.	3,643.00	I.V.A.	
		TOTAL	108,502.22	TOTAL	199,799.12	TOTAL	403,628.08	TOTAL	189,635.98	TOTAL	7,228.56	TOTAL	1,291,427.22	TOTAL	26,411.75	TOTAL	

RESUMEN

ESTIMACION No. 1 NORMAL	133,623.43
ESTIMACION No. 2 NORMAL	246,058.03
ESTIMACION No. 3 NORMAL	497,078.91
ESTIMACION No. 4 NORMAL	233,541.85
ESTIMACION No. 5 NORMAL	309,231.52
ESTIMACION No. 1 ADITIVA	32,526.79
ESTIMACION No. 2 ADITIVA	69,714.66
ESTIMACION No. 1 EXTRA	155,139.11
SUB-TOTAL	1,676,914.30
I.V.A.	268,306.29
TOTAL	1,945,220.59
ADITIVAS	118,600.08
EXTRAS	179,961.37
DEDUCTIVAS	1,291,427.22
MONTO DE CONVENIO	-992,865.77
MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO	2,938,086.36
MONTO ACTUAL DEL CONTRATO	1,945,220.59
TOTAL AMORTIZADO	881,425.91
SALDO POR AMORTIZAR	0.00

FECHA REAL DE INICIO: 16 DE JULIO DEL 2025
FECHA REAL DE TERMINO: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2025
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 15 DE JULIO DEL 2025
FECHA TERMINO DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

CONSTRUCCION INDUSTRIAL Y PROVEEDORES BELES, S.A. DE C.V.
C. JESUS IGNACIO NARVAEZ ESPINOZA
CONTRATISTA

FINIQUITO FIRMADO EL DIA : 01 DE NOVIEMBRE DEL 2025

ING. SÁBAS GUERRA ESPINOSA
SUPERVISOR
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FAISMUN / RAMO 33

2025 -

OPERADO

FAISMUN / RAMO 33

2025

OPERADO

20/25

FINIQUITO DE OBRA

No. DE CONTRATO: SOP-MTY-FAISMUN-04/25-IR
DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN CALLE CESAR LAZO ENTRE LAS CALLES ARTURO B. DE LA GARZA Y SOLIDARIDAD DE LA COLONIA CERRO DE LA CAMPANA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.
CONTRATISTA: CONSTRUCCION INDUSTRIAL Y PROVEEDORES BELES, S.A. DE C.V.

No.		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	EST. No. 1 NORMAL		EST. No. 2 NORMAL		EST. No. 3 NORMAL		EST. No. 4 NORMAL		EST. No. 5 NORMAL		DEDUCTIVAS		EST. No. 1 ADITIVA		EST. No.
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD
						EN LA CD. DE MONTERREY, N.L.														

OPERADO

2025

FAISMUN / RANIO 33




21/25

MONTO DEL CONTRATO: 2,938,086.36
ANTICIPO: 881,425.91
FECHA DE INICIO: 16/07/2025
FECHA DE TERMINO: 01/11/2025
MONTO DEL CONVENIO: -992,865.77

2 ADITIVA	EST. No. 1 EXTRA		ACUMULADO TOTAL	
IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
7,723.52			310.05	30,220.57
12,349.69			105.59	82,271.50
			216.55	69,417.27
21,567.73			48.52	66,023.10
			39.53	66,040.40
			27.46	103,900.40
28,073.72			218.48	445,104.93
			186.10	560,049.34

OPERADO
2025 -
FUSION / RAMO 33



22/22


MONTO DEL CONTRATO: 2,938,086.36
ANTICIPO: 881,425.91
FECHA DE INICIO: 16/07/2025
FECHA DE TERMINO: 01/11/2025
MONTO DEL CONVENIO: -992,865.77

2 ADITIVA	EST. No. 1 EXTRA		ACUMULADO TOTAL	
IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
			7.00	37,516.92
			7.00	61,230.75
	91.57	95,845.40	91.57	95,845.40
	7.00	59,293.71	7.00	59,293.71

69,714.66	SUB-TOTAL 1	155,139.11	SUB-TOTAL 1	1,676,914.30
20,914.40	AMORTIZ.	46,541.73	AMORTIZ.	0.00
48,800.26	SUB-TOTAL 1	108,597.38	SUB-TOTAL 1	1,676,914.30
7,808.04	I.V.A.	17,375.58	I.V.A.	268,306.29
56,608.30	TOTAL	125,972.96	TOTAL	1,945,220.59

OPERADO
2025 -
FASHION / RAMO 33


23/25

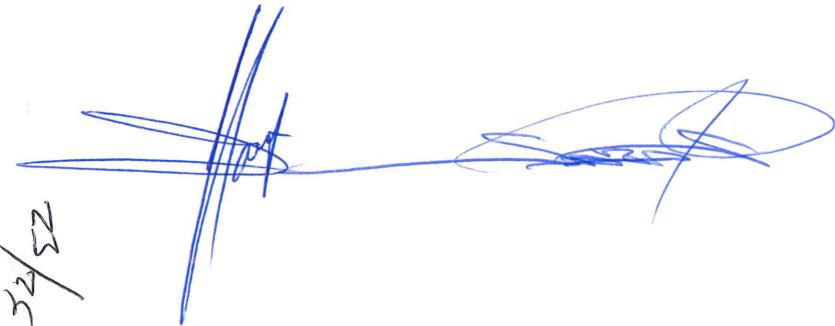

MONTO DEL CONTRATO: 2.938.086,36
ANTICIPO: 881.425,91
FECHA DE INICIO: 16/07/2025
FECHA DE TERMINO: 01/11/2025
MONTO DEL CONVENIO: -992.865,77

2 ADITIVA	EST. No. 1 EXTRA		ACUMULADO TOTAL	
IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE

OPERADO
2025 -
FAISMUN / RAMO 33



24/25
